

Neusphere internal meeting

2026.05.14

confidential

Release plan overview

▼ Internal release

★ Tetras release
★ SSS release



Project & Version		M04	M05	M06	M07	M08
Stream	V1.5.0_GPU	V1.5.0_GPU ▼ TBD				
Vision Claw	MVP	MVP ▼ 4/23				
	V0.2	V0.2 ▼ 5/13				
	V	V ▼ TBD				
Neusphere On-Premise	V2.5_Hotfix_v1	Bug fix ▼ 5/9				

Summary

Vision Claw:

1. 。

Stream: 当前测试有阻塞，版本交付有延迟。

1. V1.5.0适配40系列版本测试中。当前检测模板精度较低，分类也面临同样问题，整体行为特征尚未提测，需优先解决测试报出的模板问题。5/14同步进展。
2. 50系列适配需与行为感知模板开发同步进行，开发完成时间预估为5/22

On-Premise:

1. V2.5 hotfix v1正式发版给SSS。

Vision Claw_V0.2 (5/13)

[Ones case list](#) [Vision Claw_V0.2](#)

Product

Image

System

Test



TETRAS.AI

Sprint	M04					M05					M06				
	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5
V0.2															
V0.3 (TBD)															

清明

劳动节

Product

4/30

Image

5/13

Front-end

5/13

System

5/13

5/13

序号	日期	内容	回复
16	26/04/27	下一版本 (V0.2) 的产品需求定稿进行中；确认“开发排期”后续进行。 【4/29】 12#和13#已完成；14#4/30 14:00商定工程开发完成日期 【4/30】 14#完成排期确认。 1. 工程：5/13~14，针对新增的内容，产品4/30给出。旧接口相关材料和新材料统一5/15给前端。 2. 工程完成全部开发任务日期5/20 3. 前端：5/19输出结果，review原型文档后做最终确认。 4. 测试：测试集要求文档产品5/8输出。要求：总共不少于100条；每个能力至少1条。Risk：非并发队列、对测试时长有影响。	Done
17	26/5/7	确定V0.2开发scope和完成日期	Done
18	26/5/7	测试集的维护。按照 链接 中D和G列准备@晓楠	Done
19	26/5/11	V0.2之后的版本scope需在周三前完成团队商定。@昊呈	Done
20	26/5/11	数据集和测试用例的准备优先级：first, V0.2+MVP, 2 nd 下一周版本。 @晓楠@京杰	Done

19#_Vision Claw_V0.2开发需求scope

confidential

STREAM V1.5.0_GPU (TBD)

[Ones case](#)
[list_V1.5.0_GPU](#)

Product


Image

System

Test



TETRAS.AI

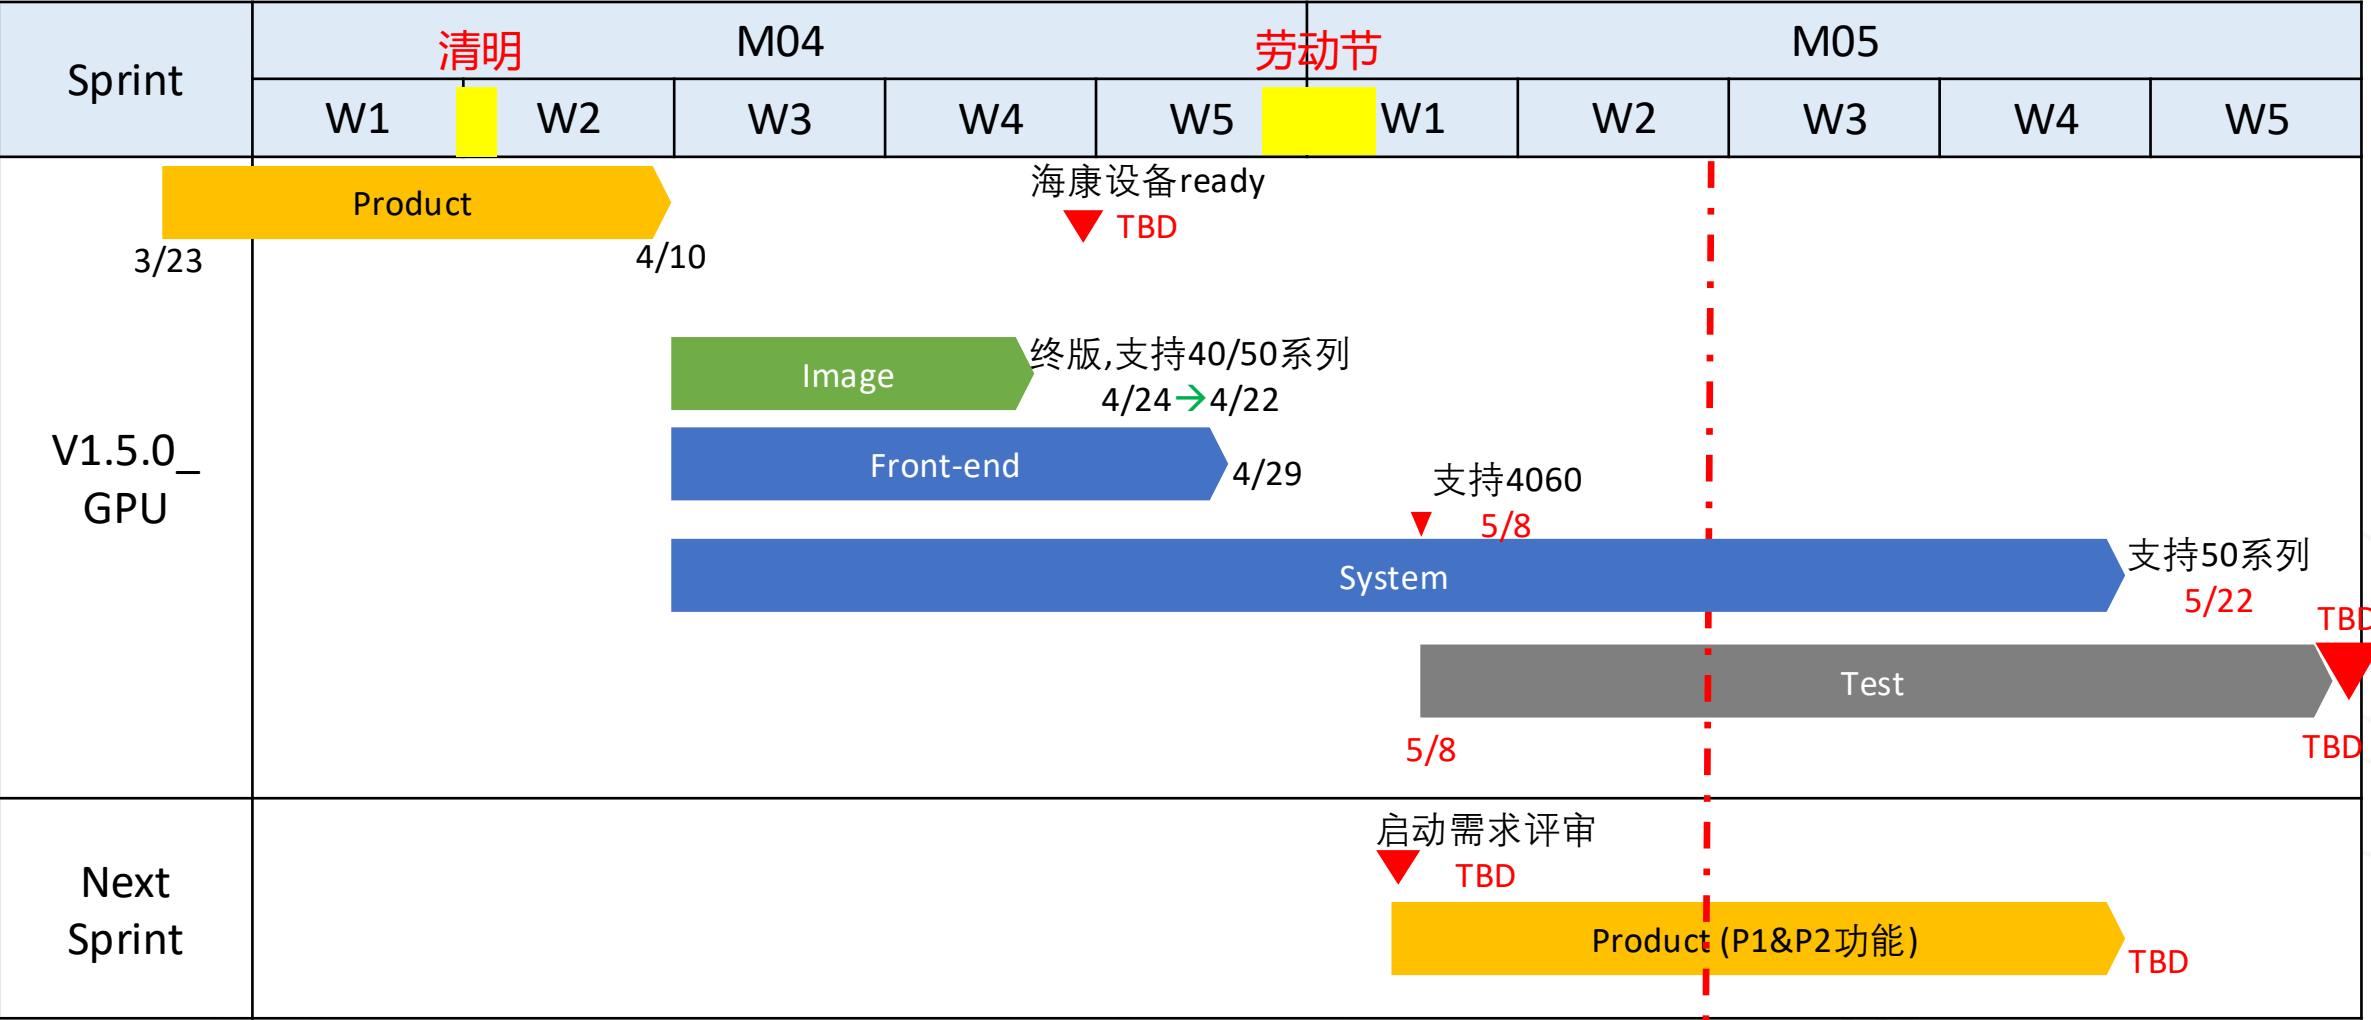

序号	日期	内容	回复
4	26/3/11	视频动作识别可基于链接中的发版文档开发；研究这边开发已完成。 模块遇到问题可以联系文档流程上对应的负责人。 tgds-offline v1.4 anction anyalisis	Done
5	26/3/12	设计“区分正负样本”的方法；3/19周会提交 @金晟 【03/19】1. 从 标准产品的角度 继续看下该如何处理？ @郅韬@金晟 1.1. 与产品一起讨论：二阶段是否对缺陷检测是合适的方案？	Done
6	26/3/16	V1.4.0GPU开发需求变更， @昊呈@志勋cc： @All (1) 3月20号，实现P0功能的用户账户、去除小模型和行为分析模版 (2) 之后在测试过程中同步进行bug修复，以及实现P0功能的自动标注等全部P0需求（预计3月25号发一个中间版本） (3) P1版本的Evaluation不在本期实现 →转入V1.5.0实现	Done
7	26/3/16	5060笔记本安装Stream支持、含适配。 @意遥 @泽文	Ongoing
8	26/3/20	@昊呈：由于视频格式和编码方式适配的原因， 视频格式仅支持mp4（除hevc编码外）和mov， 不需要再支持avi。 全昊呈 3/20 11:44 @刘阿侯 @闫京杰 @刘志勋 @安彩燕 @周意遥 cc @陈逸 stream 1.4，由于视频格式和编码方式适配的原因，视频格式仅支持mp4（除 hevc 编码外）和 mov，不需要再支持 avi。	Done
9	26/3/27	发布V1.3.4版本，用于解决 “部分推理结果不会被可视化出来的情况” ；并发布给济南二机床继续体验	Done

序号	日期	内容	回复
6	26/4/20	商定下个版本的stream产品需求“讨论”节点 @Roc@昊呈	Done
7	26/4/23	研究终版提前2日交付。@意遥@郅韬 备注：50系列的环境升级不涉及代码的更新；直接共用一套代码就行。 仅涉及环境的升级。	Done
8	26/4/27	下个版本的产品需求信息收集。@昊呈 【5/11】根据未来产品规划和开发进度安排时间与开发团队讨论确认	Done
9	26/4/27	“行为感知”更改完成日期至5/8，“分类”争取4/30完成，“检测”4/30完成。 @泽文；立根的3个任务项4/30完成。 【4/30】取消4/30版本提测，合并至5/8统一提测。	Done
10	26/4/27	前端需要工程输入“接口”和“接口文档”，“case list”；环境数据要搞好。 4/29中午前需完成。否则影响前端提测前完成开发。@泽文@立根@何醇	Done
11	26/5/7	“#948553 [P0]新增行为感知的evaluation”不需要在5/8提测版本（适配40系列）中测试，改为在适配50系列的版本中进行。@京杰	Done
12	26/5/11	50系列适配开发工作量，及提测日期确认。@泽文@何醇 【5/11】计划5/22完成开发并提测，含“分类”功能实现	Ongoing

序号	日期	内容	回复
13	26/5/11	用5090笔记本摸底V1.4.2的精度表现。@京杰	Done
14	26/5/11	【新需求】适配50系列的V1.4.3版本已提测。	Done

confidential

V2.5_Hotfix_v1 (On-Premise 5/9 release)

Planning

Image

System

Test

链接: [V2.5_Hotfix_v1](#)

