

Neusphere internal meeting

2026.05.14

confidential

Release plan overview

▼ Internal release

★ Tetras release
★ SSS release



Project & Version		M04	M05	M06	M07	M08
Stream	V1.5.0_GPU	V1.5.0_GPU ▼5/E				
Vision Claw	MVP	MVP ▼4/23				
	V0.2	V0.2 ▼5/13				
	V0.3	V0.3 ▼5/20				
Neusphere On-Premise	V2.5_Hotfix_v1	Bug fix ▼5/9				

Summary

Vision Claw:

1. V0.2版本演示
2. V0.3版本完成开发需求规划、准备启动开发工作

Stream: 当前测试有阻塞，版本交付有延迟。

1. V1.5.0适配40系列版本测试中。主要的检测和分类模版精度较低的问题已经修复，工程自测中。5/15出V1.5.1版本给测试继续完成剩余测试。
2. V1.5.0版本适配50系列开发中、行为感知模板开发同步进行；开发完成时间预估为5/22
3. 新增V1.4.4版本支持50系列；精度和性能符合预期。

On-Premise:

1. V2.5 hotfix v1正式发版给SSS。
2. 配合Pentas做些部署问题解答。

Vision Claw_V0.2 (5/13)

[Ones case list](#) [Vision Claw_V0.2](#)

Product

Image

System

Test



TETRAS.AI

Sprint	M04					M05					M06				
	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5
V0.2															
V0.3 (TBD)															

序号	日期	内容	回复
16	26/04/27	下一版本 (V0.2) 的产品需求定稿进行中；确认“开发排期”后续进行。 【4/29】12#和13#已完成；14#4/30 14:00商定工程开发完成日期 【4/30】14#完成排期确认。 1. 工程：5/13~14，针对新增的内容，产品4/30给出。旧接口相关材料和新材料统一5/15给前端。 2. 工程完成全部开发任务日期5/20 3. 前端：5/19输出结果，review原型文档后做最终确认。 4. 测试：测试集要求文档产品5/8输出。要求：总共不少于100条；每个能力至少1条。Risk：非并发队列、对测试时长有影响。	Done
17	26/5/7	确定V0.2开发scope和完成日期	Done
18	26/5/7	测试集的维护。按照 链接 中D和G列准备@晓楠	Done
19	26/5/11	V0.2之后的版本scope需在周三前完成团队商定。@昊呈	Done
20	26/5/11	数据集和测试用例的准备优先级：1 st V0.2+MVP，2 nd V0.3。@晓楠@京杰	Done
21	26/5/14	1. 找些豆包做不了的视频来测试；提高测试case难度 2. 前端增加“豆包直出（API）”的结果；便于差异（能力、精度）比对 3. 提高Demo整体成功率	Todo

序号	日期	内容	状态

confidential

19#_Vision Claw_V0.2开发需求scope

confidential

STREAM V1.5.0_GPU (5/E)

[Ones case](#)
[list_V1.5.0_GPU](#)

Product


Image

System

Test



TETRAS.AI

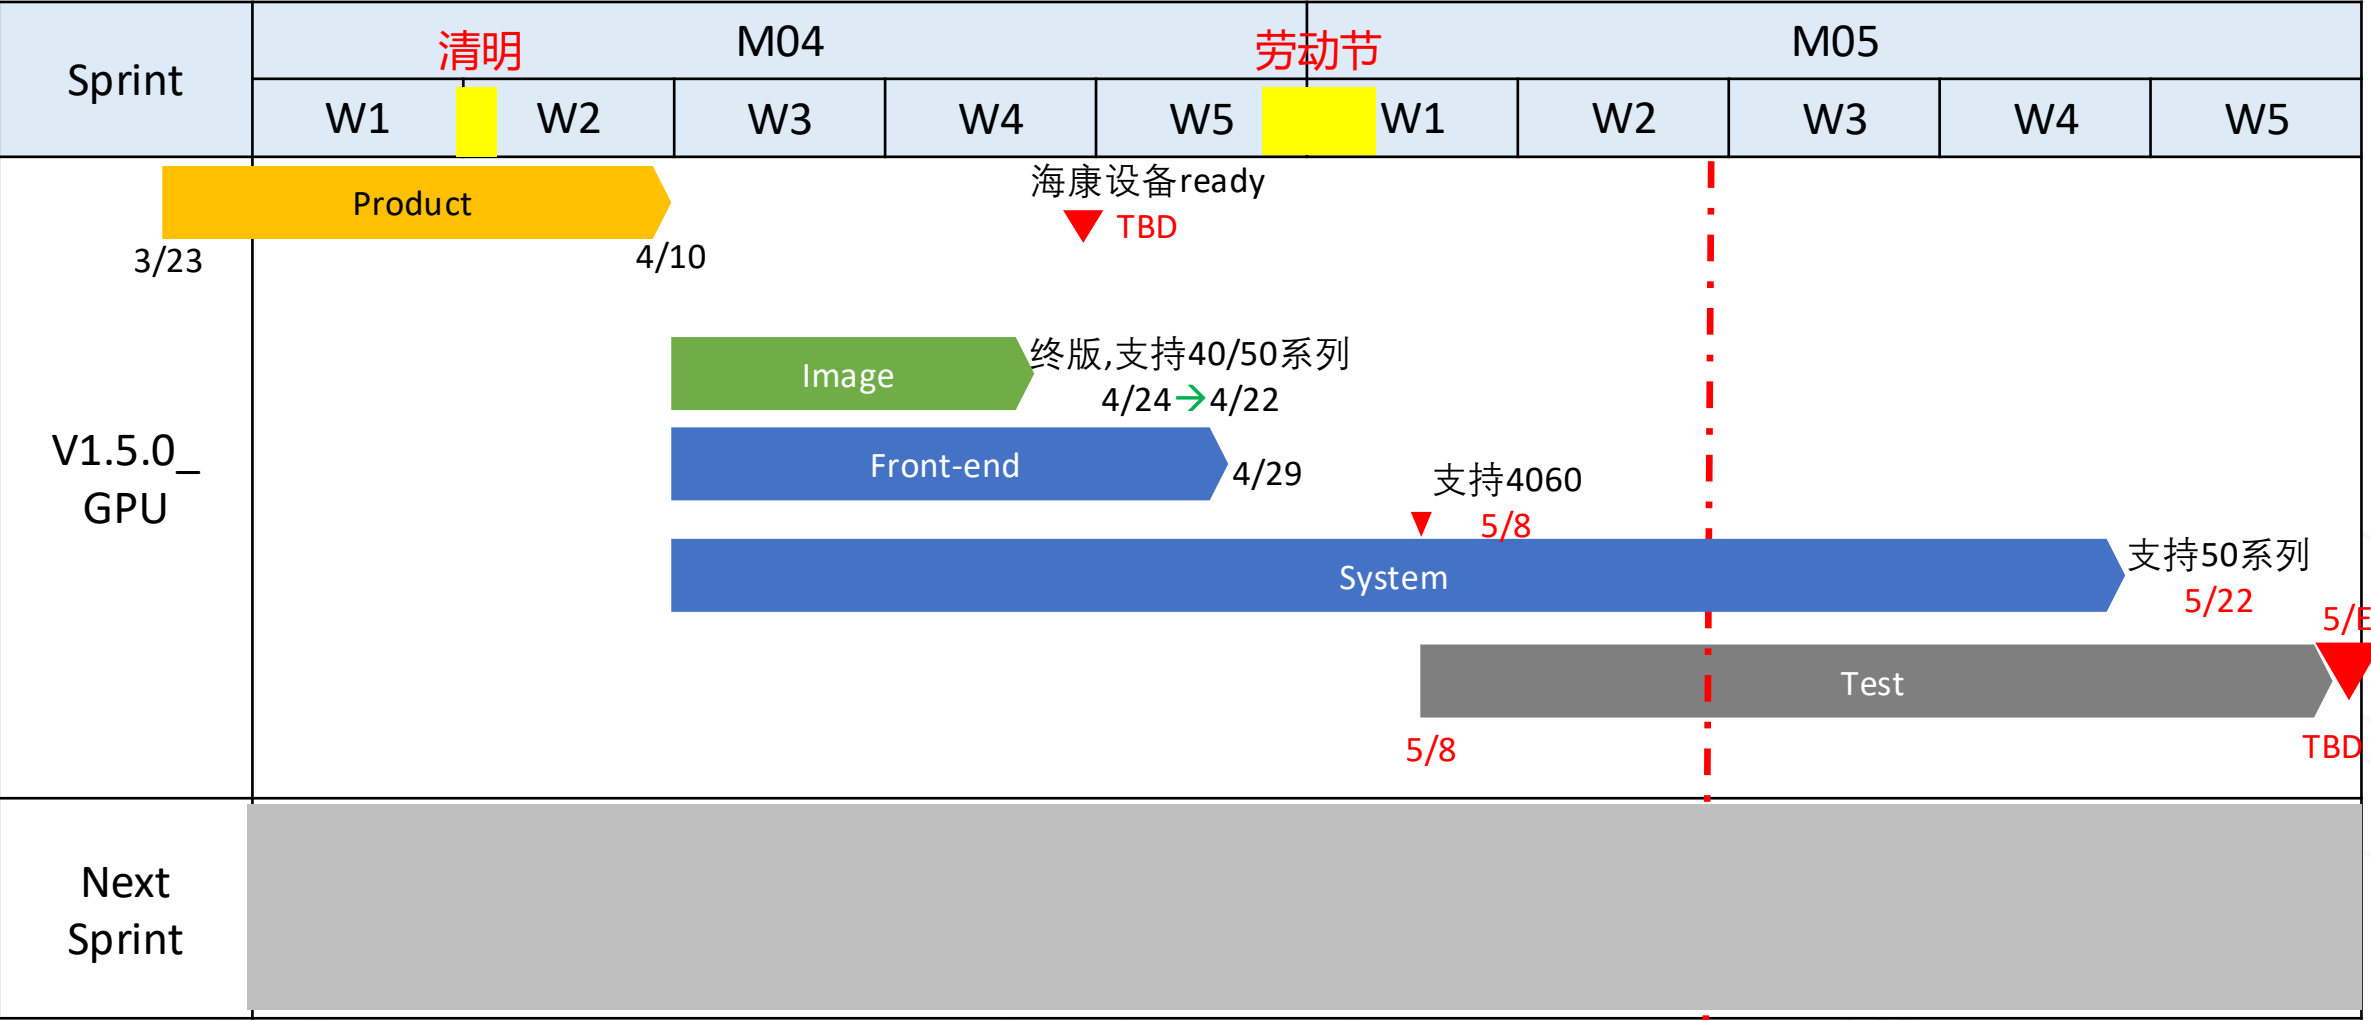

序号	日期	内容	回复
4	26/3/11	视频动作识别可基于链接中的发版文档开发；研究这边开发已完成。 模块遇到问题可以联系文档流程上对应的负责人。 tgds-offline v1.4 anction anyalisis	Done
5	26/3/12	设计“区分正负样本”的方法；3/19周会提交 @金晟 【03/19】1. 从 标准产品的角度 继续看下该如何处理？ @郅韬@金晟 1.1. 与产品一起讨论：二阶段是否对缺陷检测是合适的方案？	Done
6	26/3/16	V1.4.0GPU开发需求变更， @昊呈@志勋cc： @All (1) 3月20号，实现P0功能的用户账户、去除小模型和行为分析模版 (2) 之后在测试过程中同步进行bug修复，以及实现P0功能的自动标注等全部P0需求（预计3月25号发一个中间版本） (3) P1版本的Evaluation不在本期实现 →转入V1.5.0实现	Done
7	26/3/16	50系列笔记本安装Stream支持、含适配。 @意遥 @泽文@志勋 【5/13】 V1.4.3版本适配成功；适配V1.5.x版本继续进行。	Done
8	26/3/20	@昊呈：由于视频格式和编码方式适配的原因， 视频格式仅支持mp4（除hevc编码外）和mov， 不需要再支持avi。 全昊呈 3/20 11:44 @刘阿侯 @闫京杰 @刘志勋 @安彩燕 @周意遥 cc @陈逸 stream 1.4，由于视频格式和编码方式适配的原因，视频格式仅支持mp4（除 hevc 编码外）和 mov，不需要再支持 avi。	Done
9	26/3/27	发布V1.3.4版本，用于解决 “部分推理结果不会被可视化出来的情况” ；并发布给济南二机床继续体验	Done

序号	日期	内容	回复
6	26/4/20	商定下个版本的stream产品需求“讨论”节点 @Roc@昊呈	Done
7	26/4/23	研究终版提前2日交付。@意遥@郅韬 备注：50系列的环境升级不涉及代码的更新；直接共用一套代码就行。 仅涉及环境的升级。	Done
8	26/4/27	下个版本的产品需求信息收集。@昊呈 【5/11】根据未来产品规划和开发进度安排时间与开发团队讨论确认	Done
9	26/4/27	“行为感知”更改完成日期至5/8，“分类”争取4/30完成，“检测”4/30完成。 @泽文；立根的3个任务项4/30完成。 【4/30】取消4/30版本提测，合并至5/8统一提测。	Done
10	26/4/27	前端需要工程输入“接口”和“接口文档”，“case list”；环境数据要搞好。 4/29中午前需完成。否则影响前端提测前完成开发。@泽文@立根@何醇	Done
11	26/5/7	“#948553 [P0]新增行为感知的evaluation”不需要在5/8提测版本（适配40系列）中测试，改为在适配50系列的版本中进行。@京杰	Done
12	26/5/11	50系列适配开发工作量，及提测日期确认。@泽文@何醇 【5/11】计划5/22完成开发并提测，含“分类”功能实现	Ongoing

序号	日期	内容	回复
13	26/5/11	用5090笔记本摸底V1.4.2的精度表现。@京杰	Done
14	26/5/11	适配50系列的V1.4.3版本已提测。 【5/13】测试已完成； 测试报告	Done

confidential

V2.5_Hotfix_v1 (On-Premise 5/9 release)

Planning

Image

System

Test

链接: [V2.5_Hotfix_v1](#)

