

Neusphere internal meeting

2026.05.07

confidential

Release plan overview

▼ Internal release

★ Tetras release
★ SSS release



Project & Version		M03	M04	M05	M06	M07
Stream	V1.5.0_GPU	V1.5.0_GPU ▼ TBD				
Vision Claw	MVP	MVP ▼ 4/23				
	V0.2	V0.2 ▼ 5/13				
Neusphere On-Premise	V2.5_Hotfix_v1	Bug fix ▼ 5/9 ★ SSS release 5/E				

confidential

Summary

Vision Claw:

1. V0.2版本的产品需求list及排期已完成定稿。

Stream:

1. 除了“行为感知”功能外，支持40系列的V1.5.0于5/8提测。
2. 支持50系列的版本开发进行中，完成日期待确认。

On-Premise:

1. V2.5 hotfix v1回归测试进行中。

Vision Claw_V0.2 (5/13)

[Ones case list](#) [Vision Claw_V0.2](#)

Product

Image

System

Test



TETRAS.AI

Sprint	M04					M05					M06				
	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5	W1	W2	W3	W4	W5
V0.2															
V0.3 (TBD)															

清明

劳动节

Product

4/30

Image

5/13

Front-end

5/13

System

5/13

5/13

序号	日期	内容	回复
16	26/04/27	下一版本 (V0.2) 的产品需求定稿进行中；确认“开发排期”后续进行。 【4/29】12#和13#已完成；14#4/30 14:00商定工程开发完成日期 【4/30】14#完成排期确认。 1. 工程：5/13~14，针对新增的内容，产品4/30给出。旧接口相关材料和新材料统一5/15给前端。 2. 工程完成全部开发任务日期5/20 3. 前端：5/19输出结果，review原型文档后做最终确认。 4. 测试：测试集要求文档产品5/8输出。要求：总共不少于100条；每个能力至少1条。Risk：非并发队列、对测试时长有影响。	Done
17	26/5/7	确定V0.2开发scope和完成日期	Done
18	26/5/7	测试集的维护。按照 链接 中D和G列准备@晓楠	Todo

confidential

17#_Vision Claw_V0.2开发需求_确认版

1	需求分类	具体需求内容	优先级
2	前后处理能力	Counting计数统计（通用需求）	P1
3		距离测算计算（二机床需求）	P1
4		标准化SOP流程执行（必须有文本输入描述sop）	P0
5	输出能力	tracking目标可视化渲染：mp4格式	P2
6	核心模型能力拓展	关键点检测（KptLLM++）	P0
7		图文比对（Doubao-VL-embedding）	P1
8		图图比对（Doubao-VL-embedding）	P1
9		图片描述（Doubao）	P1
10		视频描述（Doubao）	P1
11		人脸识别特征提取pipeline（1:1比对）	P2
12		human reid pipeline（1:1比对）	P1
13		人体综合分析API（包括：人体/人脸/人头检测+人体关键点+性别+年龄+HeadPose）	P2
14	现有问题修复	需可视化图片时，仅返回路径无渲染问题修复	P0

STREAM V1.5.0_GPU (5/15)


[Ones case](#)
[list_V1.5.0_GPU](#)

Product
Image

System
Test



TETRAS.AI

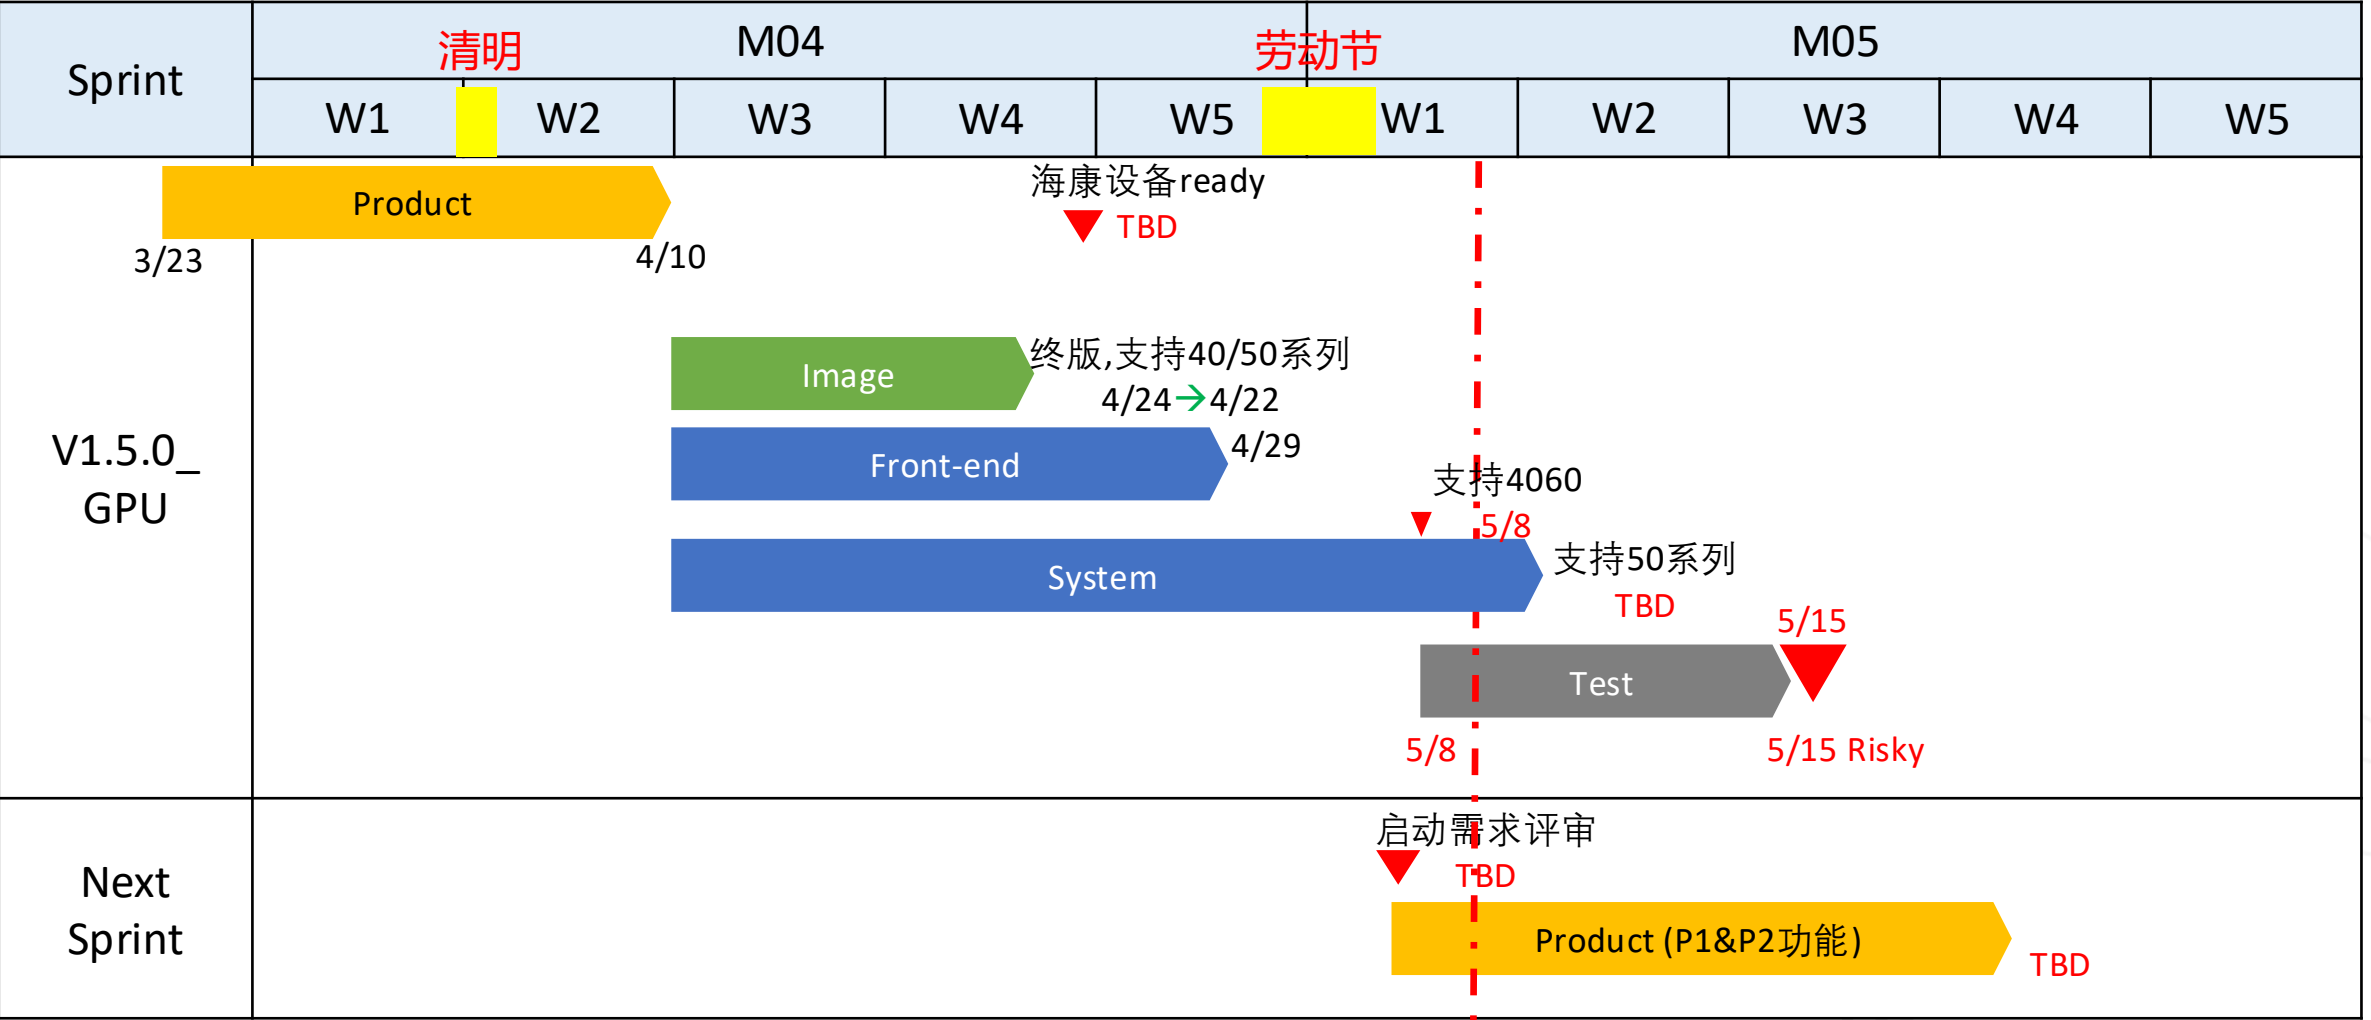

序号	日期	内容	回复
4	26/3/11	视频动作识别可基于链接中的发版文档开发；研究这边开发已完成。 模块遇到问题可以联系文档流程上对应的负责人。 tgds-offline v1.4 anction anyalisis	Done
5	26/3/12	设计“区分正负样本”的方法；3/19周会提交 @金晟 【03/19】1. 从 标准产品的角度 继续看下该如何处理？ @郅韬@金晟 1.1. 与产品一起讨论：二阶段是否对缺陷检测是合适的方案？	Done
6	26/3/16	V1.4.0GPU开发需求变更， @昊呈@志勋cc: @All (1) 3月20号，实现P0功能的用户账户、去除小模型和行为分析模版 (2) 之后在测试过程中同步进行bug修复，以及实现P0功能的自动标注等全部P0需求（预计3月25号发一个中间版本） (3) P1版本的Evaluation不在本期实现 →转入V1.5.0实现	Done
7	26/3/16	5060笔记本安装Stream支持、含适配。 @意遥 @泽文 @立根	Ongoing
8	26/3/20	@昊呈：由于视频格式和编码方式适配的原因， 视频格式仅支持mp4（除hevc编码外）和mov， 不需要再支持avi。 全昊呈 3/20 11:44 @刘阿侯 @闫京杰 @刘志勋 @安彩燕 @周意遥 cc @陈逸 stream 1.4，由于视频格式和编码方式适配的原因，视频格式仅支持mp4（除 hevc 编码外）和 mov，不需要再支持 avi。	Done
9	26/3/27	发布V1.3.4版本，用于解决“部分推理结果不会被可视化出来的情况”；并发布给济南二机床继续体验	Done

序号	日期	内容	回复
6	26/4/20	商定下个版本的stream产品需求“讨论”节点 @Roc@昊呈	Done
7	26/4/23	研究终版提前2日交付。@意遥@郅韬 备注：50系列的环境升级不涉及代码的更新；直接共用一套代码就行。 仅涉及环境的升级。	Done
8	26/4/27	下个版本的产品需求信息收集。@昊呈	Todo
9	26/4/27	“行为感知”更改完成日期至5/8，“分类”争取4/30完成，“检测”4/30完成。 @泽文；立根的3个任务项4/30完成。 【4/30】取消4/30版本提测，合并至5/8统一提测。	Done
10	26/4/27	前端需要工程输入“接口”和“接口文档”，“case list”；环境数据要搞好。 4/29中午前需完成。否则影响前端提测前完成开发。@泽文@立根@何醇	Done
11	26/5/7	“#964719 [P0]新增检测的evaluation”不需要在5/8提测版本（适配40系列）中测试，改为在适配50系列的版本中进行。@京杰	Done

V2.5_Hotfix_v1 (On-Premise 5/9 release)


Planning

Image

System

Test

链接: [V2.5_Hotfix_v1](#)

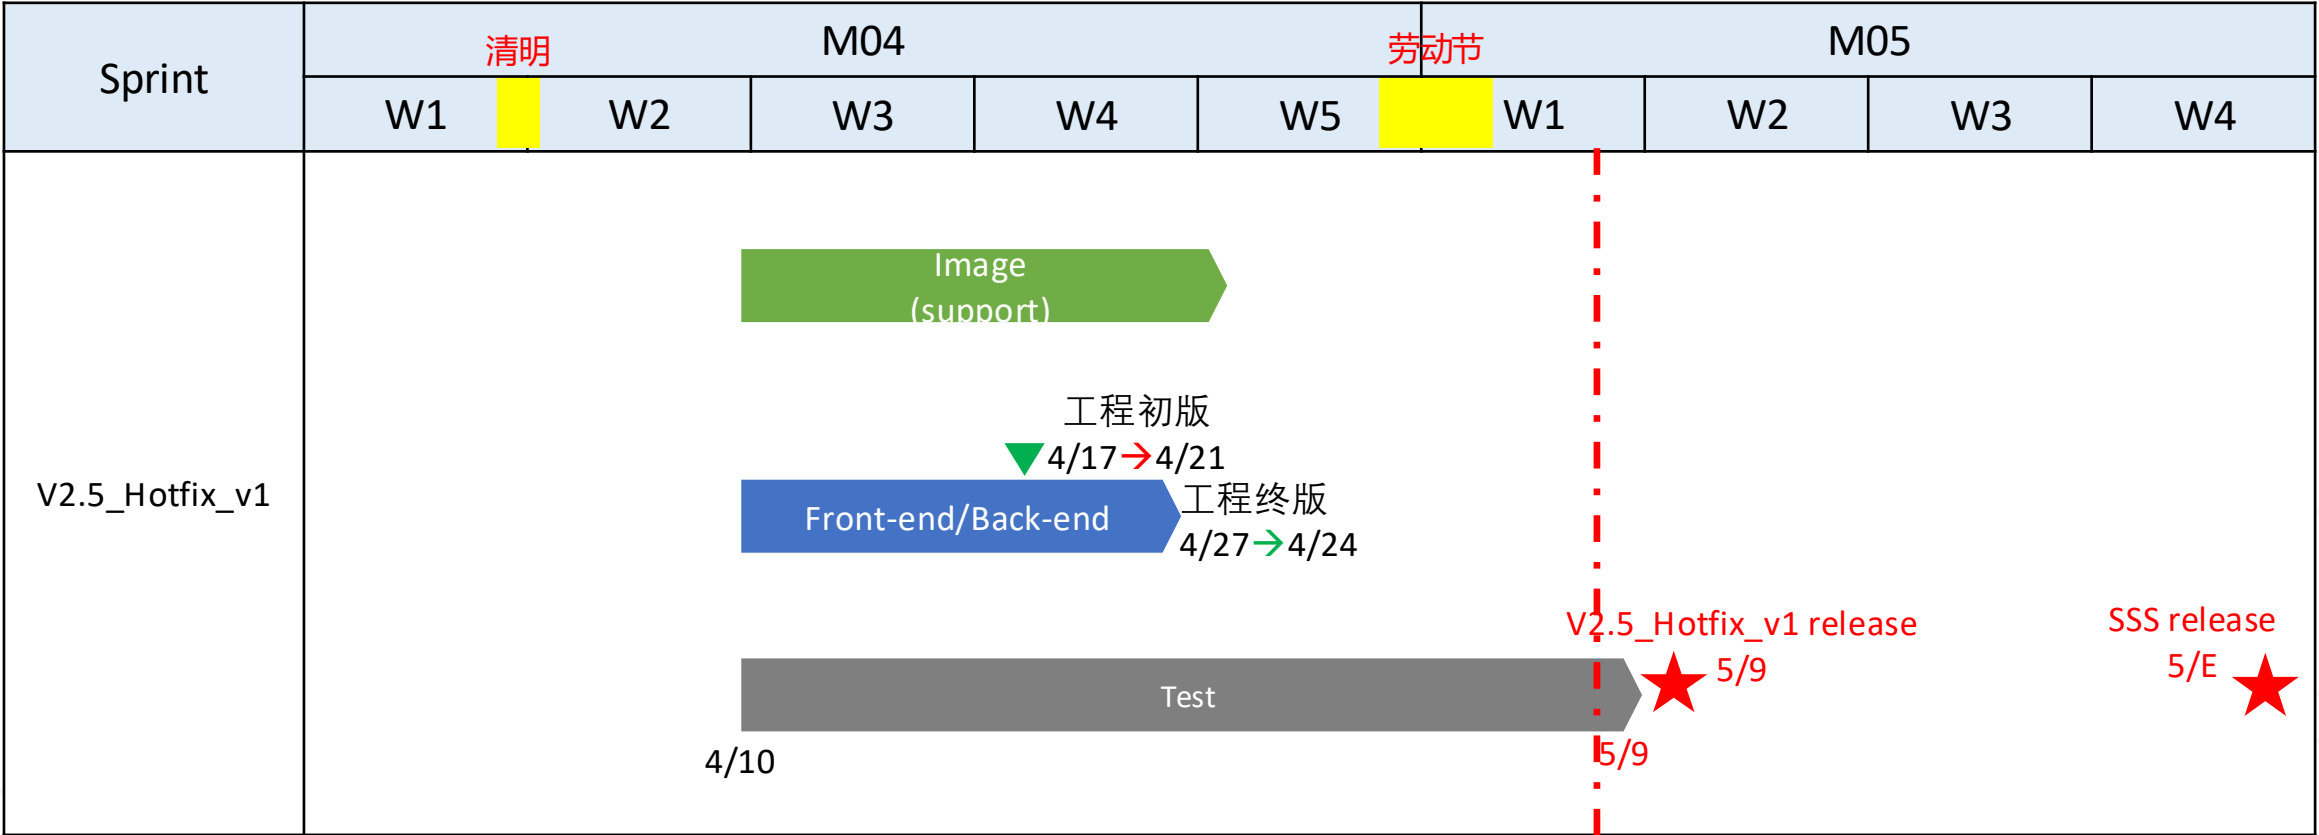

V2.5_ Hotfix_v1 _Test Summary

Sprint	测试完成进度 (Up to 04/30)
V2.5_ Hotfix_v1	需求验证: 共33个jira单, 已验证30个, 剩余3个 部署测试: v1和v2版本共23个部署包, 已验证23个 bug单: 目前共发现6个bug, 待处理2个

confidential

序号	日期	内容	回复																								
11	26/4/13	调整本次的开发和测试策略： 1. 孤立的问题修复后和环境更新后给测试 2. 涉及可能会关联到其它问题点的、需要请开发同学同步给测试知晓 3. 回归测试放到最后进行，包括主流程和修改的功能 4. Console部署测试也要进行（测试的项目list待确认）@志航 @超博@榕唯	Done																								
12	26/4/13	SSS V2.5 hotfix v1 list	Done																								
13	26/4/20	STDMX-1695。@昊呈@晓辉@彩燕@Roc	Done																								
14	26/4/20	基于STDMX-1743问题的“代码同步给SSS”机制交流。@Roc@和举@玮杰 【4/20】SSS测试前未更新RC2版本中“kangaroo-resources-develop-v2.5.0-rc2-202603.tar.gz”的内容导致测试报错。	Done																								
15	26/4/20	劳动节前后请假同学信息统计	Done																								
16	26/5/7	HD_V2和V1部署测试在SSS提供的scs01环境上测试成功	<table><tr><th>Timestamp</th><th>Software</th><th>Software Type</th><th>Deploying</th><th>Success</th><th>Fail</th></tr><tr><td>2026-05-07 14:34:12+08:00</td><td>HumanDet_78_1776944496</td><td>Edge Device SW</td><td>0 / 1</td><td>1 / 1</td><td>0 / 1</td></tr><tr><td></td><td>HumanDet_57_1776915963</td><td>Deploy</td><td>Success</td><td>May 7, 2026 14:58:53</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HumanDet_57_17769159</td><td>Deploy</td><td>Success</td><td>May 7, 2026 14:56:48</td><td></td></tr></table> Done	Timestamp	Software	Software Type	Deploying	Success	Fail	2026-05-07 14:34:12+08:00	HumanDet_78_1776944496	Edge Device SW	0 / 1	1 / 1	0 / 1		HumanDet_57_1776915963	Deploy	Success	May 7, 2026 14:58:53			HumanDet_57_17769159	Deploy	Success	May 7, 2026 14:56:48	
Timestamp	Software	Software Type	Deploying	Success	Fail																						
2026-05-07 14:34:12+08:00	HumanDet_78_1776944496	Edge Device SW	0 / 1	1 / 1	0 / 1																						
	HumanDet_57_1776915963	Deploy	Success	May 7, 2026 14:58:53																							
	HumanDet_57_17769159	Deploy	Success	May 7, 2026 14:56:48																							
17																											
